


Projekt Digitalisierung

Sachstandsbericht Umsetzung Drei-Komponenten Digitalisierungsstrategie

30.08.2021

Für FRA und HA

EXTERN (Digitalverfügbare Serviceleistungen)

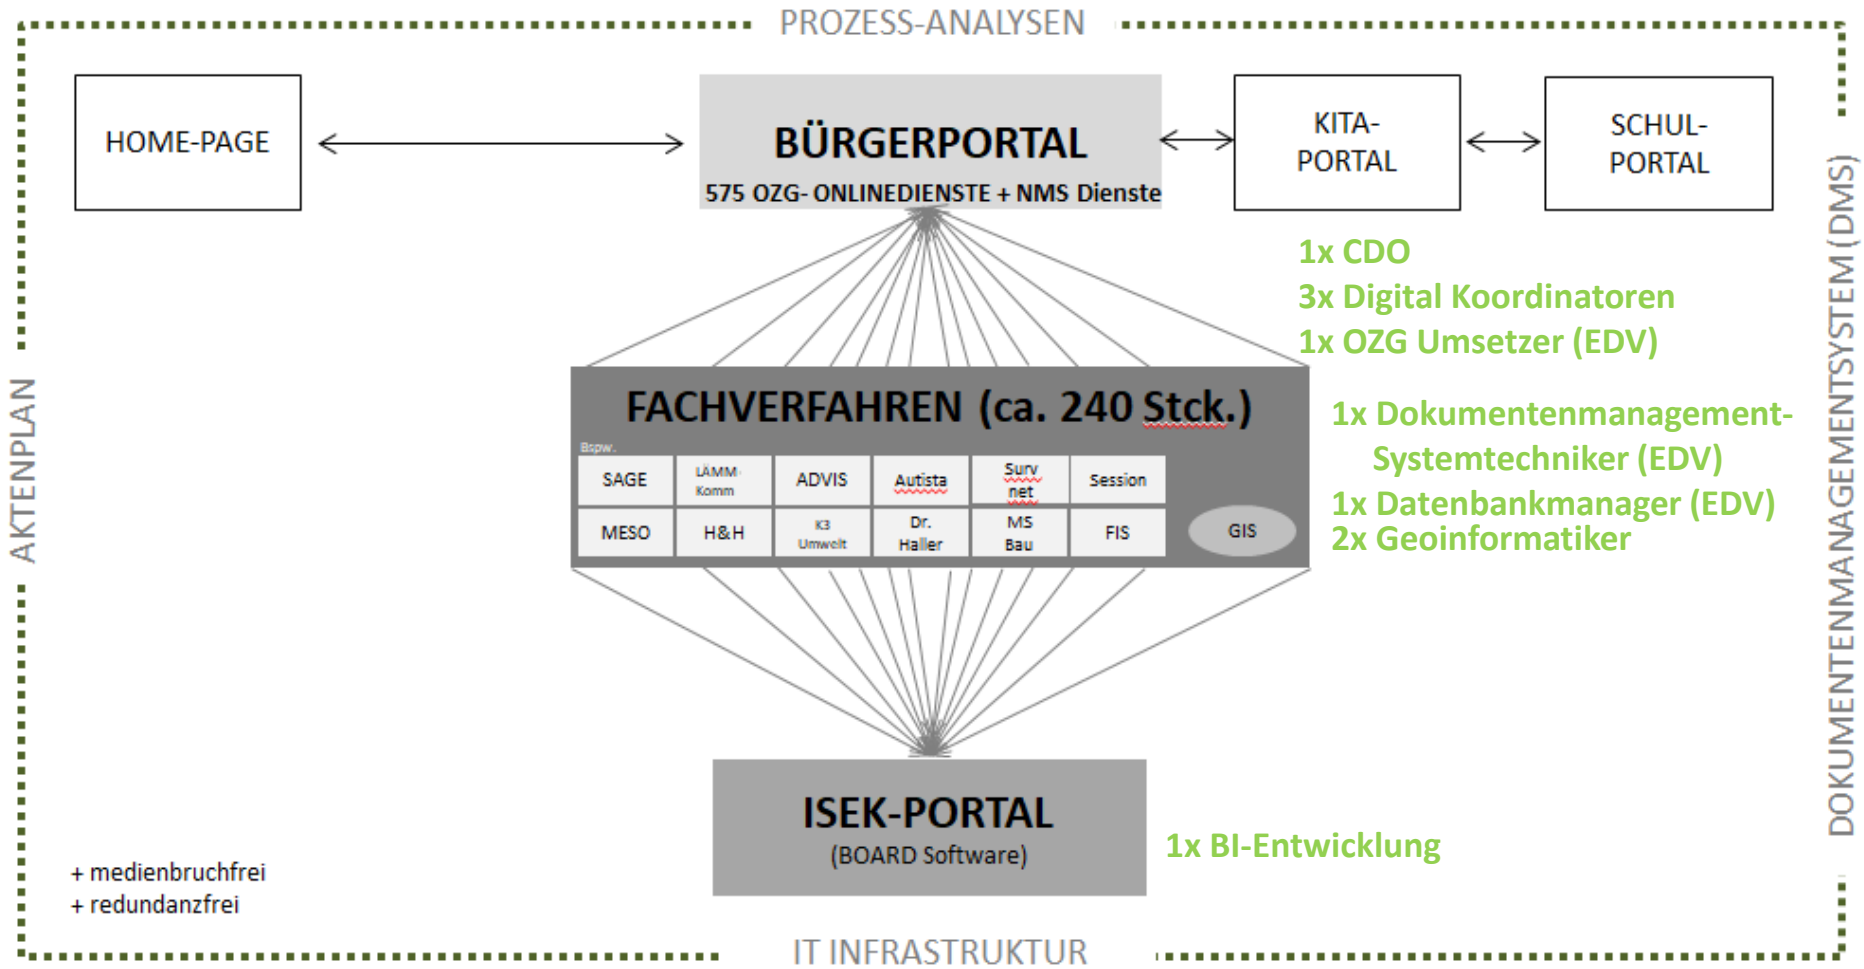


INTERN (Datenbasierte Steuerungsunterstützung)

Inhaltlich (Ablauforganisation):


1

Das „Rückgrat“

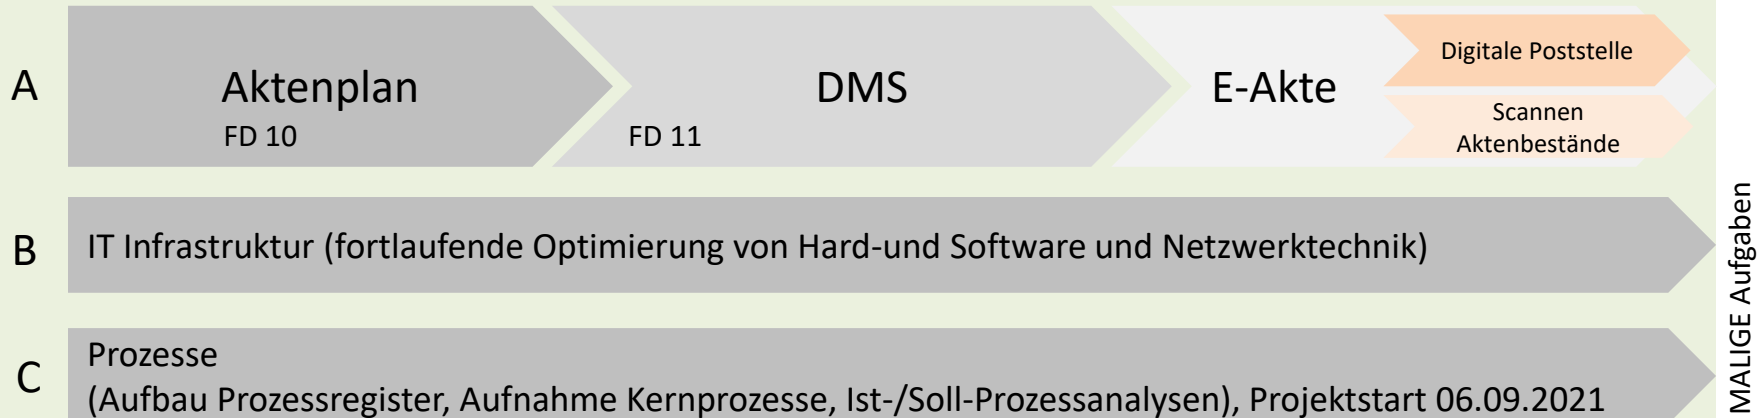

2

Das BürgerPortal (inkl. OZG-Dienste)

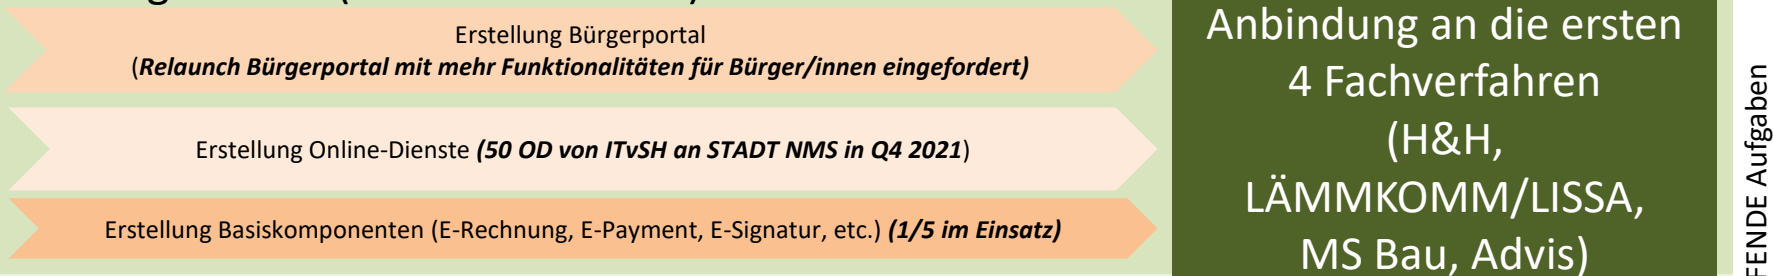

3

Das ISEK-Portal (Schnittstellen an H&H, SozialHilfe und Kinder-und Jugendhilfe in Bearbeitung)

2. Meilensteine aus Drucksache (0703/2018/DS)

Weitere Projektaufgaben, die im nächsten Schritt im Rahmen der Digitalisierung bearbeitet und soweit erforderlich zur Vorlage/Beschlussfassung in den nächsten Ratsversammlungen vorgelegt werden:

- Stellenausschreibungen (4 von 9 Stellen ab 01.04. besetzt)
- Dokumentenmanagement bis 31.12.2021 arbeitsfähig
- Aktenplan bis zum 3. Quartal 2021
- Bürgerportal ‚Live-Schaltung‘ voraussichtlich 1.Halbjahr 2022 (Zuständig ITvSH/Dataport)
- Prozessanalysen fortlaufend bis zum 30.06.2025, Aufbau Prozessregister ab 06.09.2021
- Verknüpfungen der Fachanwendungen mit dem Bürgerportal und ISEK-Portal fortlaufend bis zum 31.12.2025
- ISEK-Portal, Integration von Leistungskennzahlen fortlaufend bis 31.12.2025 (H&H, Sozialhilfen, Kinder-und Jugendhilfen)
- Konkrete Umsetzungen des Leistungskatalogs Digitalisierung fortlaufend bis 31.12.2022 (OZG-Leistungen) und 31.12.2025 (weitere neumünsterspezifische Leistungen)
- Entwicklung eines Dashboards zur Messung der Effekte der Digitalisierungsmaßnahmen (intern/extern)

 = im Zeitplan
 = Risiko des Verzugs
 = nicht im Zeitplan

VIELEN DANK FÜR DIE KONSTRUKTIVE ZUSAMMENARBEIT!
